

Nesten- ulykke byggekran

Nestenulykke den 13. april 2025


Arbeidsoperasjon

Mobilkran ble brukt på fredag 10.04.26 for å montere hulldekker. Da arbeidet ikke ble ferdigstilt denne dagen, ble den også stående på mandag 13.04.26.

På fredag kunne tårnkran brukes fritt til etter lunsj så lenge mobilkranen heiste i området ved blokk A. Etter lunsj skulle mobilkranen heise borte ved tårnkranen slik at tårnkranen måtte svinges vekk.

På mandag morgen ble det informert at det ble montering av hulldekke til nedkjøringsrampe før mobilkran skulle kjøres vekk i 11 tiden. Arbeidet med plattendekke ble påbegynt og en fikk montert hele første bil.

Ulykken inntreffer

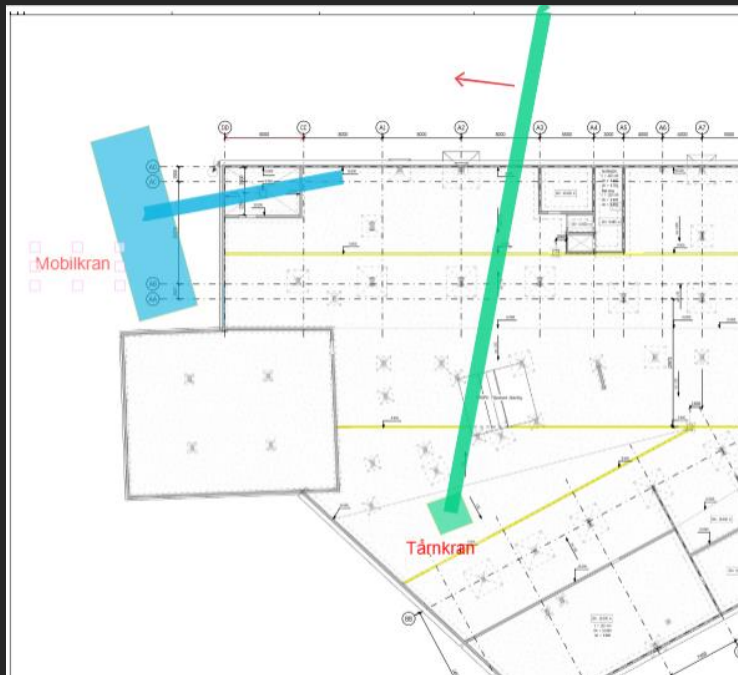

Mobilkranen starter montering av huldekk for nedkjøringsrampen, og løfter bommen for å nå ut.

Det ble avtalt å kjøre annen hvert element, men det ble ikke vurdert at det er slakk på hiv wier når det ikke er last i kranen.

Tårnkran svingte over mobilkranen for å hente nytt element. Han plasserte løpekatten inn til stammen for å gå klar av mobilkranen. Men når løpekatten plasseres inn til kranen, blir hiv wieren hengende under. Og her ble den hengende under så lavt at den hukket i toppen av mobilkranen.

Når den hukket ble høna (løftekroken) løftet opp og tårnkranen ble stoppet.

Tiltak

- Arbeidet ble stoppet umiddelbart
- Det ble bestemt at wiere skulle kontrolleres for skader, dette ble utført samme dag. Begge ble ansett til å være gode nok til å fortsette arbeidet, frem til det kunne byttes.
- Om det ikke er nødvendig å kjøre samtidig, skal tårnkran plasseres slik at den ikke er i konflikt og låses.
- Om en skal kjøre samtidig, må kranfører kjøre tårnkran fra hytten, slik at han har bedre kontroll på wiere og høyder.
- Risikoanalyse oppdateres i forhold til forslag til tiltak beskrevet over.



Medvirkende faktorer som har ført til ulykken

- Hulldekke montasje tok lengre tid enn planlagt, var planlagt slutført på fredag
